


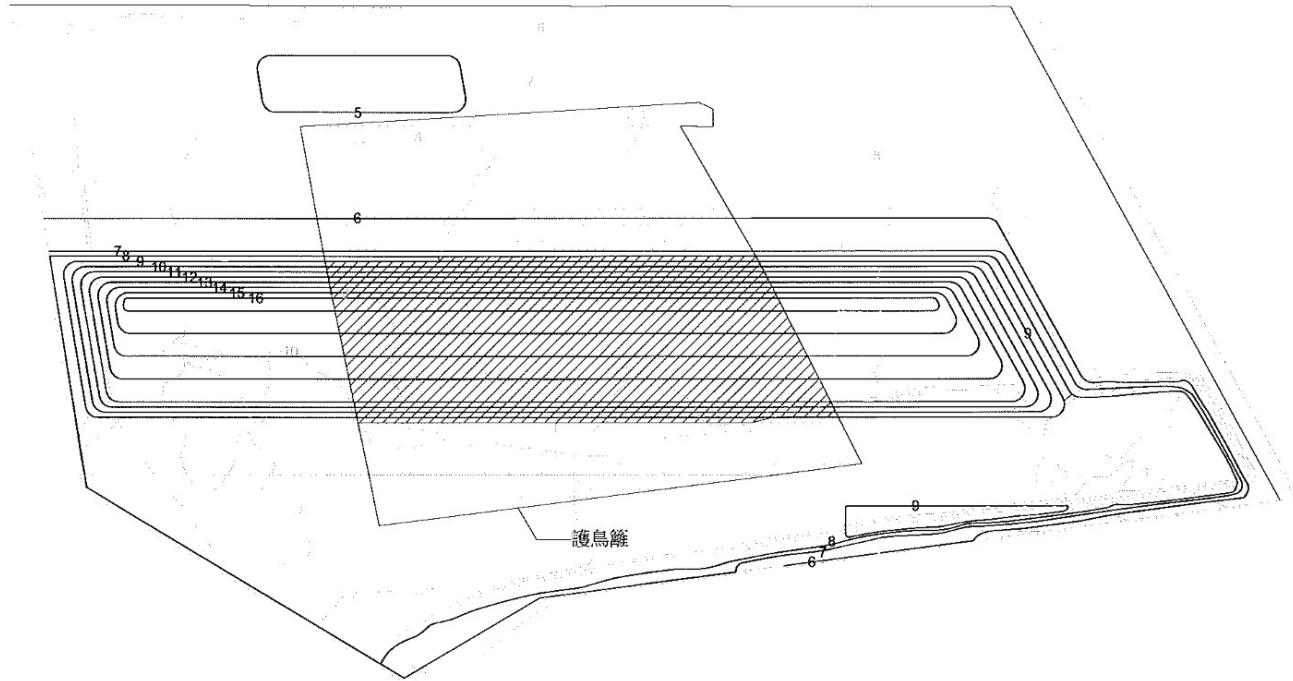


桃園市政府農業局 現勘紀錄

- 一、 工程名稱：竹圍漁港造林及景觀綠美化工程(第一期)
- 二、 會勘事由：竹圍漁港北岸新生地小燕鷗育雛區臨時保護圍籬架設範圍完成現勘確認
- 三、 會勘時間：107年6月4日(星期一)上午10時整
- 四、 會勘地點：竹圍漁港北岸新生地
- 五、 與會代表：詳簽到表
- 六、 會勘結論：
 1. 今日會同本府海管處、桃園市野鳥學會、桃園區漁會、監造單位及承包商等相關單位，已確認竹圍漁港北岸新生地小燕鷗育雛區臨時保護圍籬架設完成，同意圍籬架設區範圍外，承包商得進行施工作業。
 2. 依據107年5月21日本府海管處會議紀錄結論，本次同意承商臨時保護圍籬架設範圍內自5/21至8/15止申報停工，後續計算工期展延天數將依該區域內工程施工經費按契約總金額比例核辦。
 3. 請本局林務科於小燕鷗育雛區周邊協助設置告示牌，宣導民眾自5/21至8/15止期間不得進入騷擾，違者將依相關規定告發處理。
 4. 本竹圍漁港北岸新生地小燕鷗育雛區已完成臨時圍籬架設，後續仍請承商及桃園市野鳥學會協助派員加強巡查，如有發現圍籬遭破壞仍請通報辦理。
- 七、 散會時間：上午11時30分

| | |
|---------|---|
| 挖方區域 | |
| 填方區域 |  |
| 挖/填方前地形 |  |
| 挖/填方後地形 |  |



1
-
綠地(二)護鳥籠內部挖填方示意圖
S:1/200

| | | | | | | | | |
|----------|----|------|----|---|---|----|----|-------|
| 桃園市政府農業局 | 審查 | 簡任技正 | 局長 | 竹圍漁港造林及景觀綠美化工程(第一期) 綠地(二)護鳥籠內部挖填方示意圖 | 新綠主義股份有限公司 Gardening/Renew/Ecology/Enabling/Natu | 設計 | 核定 | 日期 |
| | 科長 | 副局長 | 日期 | | | 繪圖 | 技師 | 圖號/張號 |
